

Procesbijlage en urenverantwoording

Nieuwe logistieke aanpak projecten



Student: Sjaeco Jaques
Klas: BMU 12.2
Studentnummer: 471531
Opleiding: Bouw Management Uitvoering
School: Hogeschool van Arnhem Nijmegen
Bedrijf: BAM Utiliteitsbouw Amsterdam
Datum: Maart 2014
Email: S.Jaques@upcmail.nl / S.Jaques@bamutiliteitsbouw.nl

Inhoudsopgave

9.12: Procesbijlage, urenverantwoording

9.12.1: Gesprekken

9.12.2: Proces aanpak onderzoek

9.12.3: Aktielijst





9.12: Procesbijlage, urenverantwoording



Naam: Sjacco Jaques		Klas: BMU 12.2		Studentnummer: 471531		Onderdeel: Afstuderen		Hogeschool van Arnhem en Nijmegen		bam		Hogeschool van Arnhem en Nijmegen															
MAANDEN		WEEKEN		Mei		Juni		Juli		Augustus		September		Oktober		November		December		Januari		Feb		Maa			
				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
1 Voorbereiding, aanloop Afstuderen																											
2 Studietoelagen				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
3 Ontwerpen van werkrapport				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
4 Gespreken voeren m.b.t. Afstuderen				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
5 MAKE projectvoorstel opstellen				4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
6 Verzamel en bijeenkomsten zie week 10/11				5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
7 Plan van aanpak				6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6	
8 Plan van aanpak schrijven				7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7	
9 Plan van aanpak toelichting/opstellen in overleg met docent				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8	
10 Definitief maken plan van aanpak				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9	
11 Planning, aanpak t.b.v. Afstuderen				10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
12 Documentatie/ Literatuurstudie				11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11	
13 Interview toeken en bespreken (zie ook interview)				12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12	
14 Interview toeken t.b.v. UVS				13		13		13		13		13		13		13		13		13		13		13		13	
15 Scriptie conceptueel literatuur				14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14	
17 Analyse/ Onderzoek t.b.v. scriptie				15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15	
18 Interviews afnemen en rapporteren				16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16	
19 Wat is Smart Building Logistics				17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
20 Huidige logistieke aanpak project				18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18	
21 Aanpak 'nieuwe' logistiek diverse projecten				19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19	
22 Nieuwe logistieke aanpak project (en)				20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20	
23 Hoe investeren 'nieuwe' logistiek op UVA 2				21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21	
24 Conclusies aanbestedingen				22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22	
25 Informatiebronnen verzamelen en ordenen zie ook grootrapport				23		23		23		23		23		23		23		23		23		23		23		23	
26 Implementatie/ Monitoring				24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24	
28 Werkzaamheden voor UVA 2 t.b.v. invullen op project				25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25	
28 Implementatie/ Offsitebeoordeling				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26	
30 Grootrapport				27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27	
31 Scriptie				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28	
32 Scriptie schrijven				29		29		29		29		29		29		29		29		29		29		29		29	
34 Modelmodel maken				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30	
38 Nieuw etage aanpak scriptie				31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31	
39 Definitief aanbesteden scriptie				32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32	
41 Presentatie				33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33	
42 Presentatie maken				34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34	
35 Presenteren Nieuwe logistieke aanpak project in bedrijf				35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35	
46 Presenteren Nieuwe logistieke aanpak project op school				36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36	
48 Diploma uitreiking				37		37		37		37		37		37		37		37		37		37		37		37	
48 in opdracht nemen diploma				38		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38	
50 Toelaten				39		39		39		39		39		39		39		39		39		39		39		39	
51 Totaal tijd t.b.v. afstuderen (t.v. 840 uur)				40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40	

927



Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 10.		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Mailtjes verstuurd met PVA planning	Aan Lenard, Arjen en Ernest	
Dinsdag	Planning pva was goed kleine aanpassing gemaakt Planning gemaakt t.b.v. urenverantwoording	Op aanwijzing Arjen	
Woensdag			
Donderdag	A4 tje heb ik gemaakt en verstuurd	Aan Ernest, Arjen en Lenard + Niek van der Moolen	
Vrijdag			
Zaterdag	Aktielijst opstellen Filmpjes divers bekeken m.b.t. SBL	Hierin is te zien wat ik doe t.b.v. afstuderen	
Zondag	Administratie bijwerken: Email, aanmaken mapjes	Literatuur!	
		Administratie divers	





Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 11.		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 12.			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag				
Dinsdag				
Woensdag	* 'Driehoeks' gesprek met Arjen Bos, Lenard Brokelman en Sjacco Jaques	Locatie werk UVA te Amsterdam 08:00 uur		
	Besproken diverse verschillende dingen zie verslagje nummer 1	Verslag nummer 1		
Donderdag				
Vrijdag	Verslag schrijven van kennismakingsgesprek	Administratie		
	Literatuur uitzoeken in bibliotheek van de Hogeschool (HAN)	Literatuur		
Zaterdag	Plan van aanpak opzet maken	PVA		
	Diversen administratie (aktielijst bijhouden/ planning en email ordenen)	Administratie		
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 13.		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Mailtjes verstuurd met PVA planning	Aan Lenard, Arjen en Ernest	
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag	Plan van aanpak verbeteren en plaatjes invoegen Email ordenen	PVA Administratie	
Zaterdag	Mappensruktuur maken/ verbeteren	Administratie	
Zondag	Literatuurstudie lijst maken Diversen administratie	Literatuur Administratie	

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 14.			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Inlezen/ op internet zoeken diversen	Zeer veel informatie alleen wat is goed en wat niet?!		
Dinsdag	Plan van aanpak grove teksten invoeren			
	Gesprek met Arjen Bos/ Sjacco Jaques/ Ricardo Hartsink en UTS Mark van de Heijden en Lodewijk Boscher	Niet door gegaan		
Woensdag	Afspraak gemaakt voor twee wekelijks gesprek met Lenard	Donderdag 11 April in de middag		
Donderdag				
Vrijdag	School diverse werkzaamheden uitgevoerd			
Zaterdag	Plan van aanpak schrijven	7 uur		
Zondag	Plan van aanpak schrijven	7 uur		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 15.		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag	Gesprek van 11:00 uur tot 12:00 uur met Mark van de Heijden/ Sjacco Jaques en Arjen Bos. Niet door gegaan, UTS kon niet!		
Woensdag	Gesprek van 12:00 tot 13:00 met Arjen Bos en Sjacco Jaques over PVA	Zelf aangevraagd om Arjen op de hoogte te houden	
		Niet door gegaan, UTS kon niet!	
Donderdag	Gesprek met Lenard Brokelman en Sjacco Jaques (twee/drie wekenlijks overl.)	Op kantoor Arcadis te Amersfoort ongeveer een uur!	
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			
	Zeet druk geweest op het werk deze week!!!		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 16.		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Begroting bekeken UVA fase 2	1 uur	
Dinsdag	Planningsgesprek met Niek van de Moolen en Ton Hemels	Voor het werk	
Woensdag	Acedemiedag van 13:00 tot 18:00 uur	Locatie Arnhem, hogeschool HAN	
Donderdag	Planning, plan van aanpak aangepast	1 uur	
Vrijdag	Diverse administratie uitgevoerd	Urenverantwoording en afspraken maken 1 uur	
Zaterdag	Interviewlijst opgesteld grove vorm	Eerste aanzet 1 uur	
Zondag	Plan van aanpak schrijven en opmerkingen verwerken	5 uur	
	Interview opgesteld	2 uur	
	Plan van aanpak schrijven en opmerkingen verwerken	7 uur	

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 17		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag	Gesprek met UTS die plaats zou vinden in week 14, afspraken gemaakt wat er aangeleverd moet worden om SBL in gang te zetten!	2 uur totaal	
Woensdag			
Donderdag	Workshop operationeel plan	2 uur locatie Bam Noordwest	
Vrijdag	Veelal wat gesprekjes gevoerd en administratie gedaan .	8 uur School	
Zaterdag	Diverse literatuur gelezen	1 uur	
Zondag			

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 18			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag				
Dinsdag	Koninginnendag, geen schoolwerk gedaan!			
Woensdag				
Donderdag	Projectbezoek Nieuwbouw BMW Den Haag	Chris Pronk		
	Interview afgenomen met Chris Pronk en in de middag even gesproken met			
Vrijdag	Vincent van Driel omtrent m2 staten en of begrotingstaten	3 uur totaal		
Zaterdag	Tuinset met pa gemaakt t.b.v. leren buiten, gehele dag.			
Zondag	Uitwerken interview met Chris Pronk aan de hand van af luisteren gesprek die ik heb opgenomen (met toestemming)	5 uur		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 19			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Tuinset af maken met mijn vader	1 uur literatuur		
	Lijsten m2 aangepast en ingestuurd t.b.v. UTS	1 uur t.b.v. implementatie		
Dinsdag	Zeet druk op het werk deze week!			
	Lijsten m2 aangepast en ingestuurd t.b.v. UTS	2 uur t.b.v. implementatie		
Woensdag	Lijsten m2 aangepast en ingestuurd t.b.v. UTS Nog niet echt duidelijk wat UTS wil hebben om prijs te maken! 2 uur t.b.v. implementatie			
Donderdag	Hemelvaart, geen schoolwerk gedaan met mijn vriendin wat leuke dingen doen.	1 uur literatuur		
	Urenverantwoording bijhouden en mappen structuur bijhouden	1 uur		
Vrijdag	Tuinset gemaakt (windscherm)			
	Gesprek met Lenard en Jan Pieter op 'papier' zetten voor aanbevelingen PVA	3 uur		
Zaterdag	Aanbevelingen onderzoeken en juiste volgorde bepalen pva	4 uur		
	Plan van aanpak aanpassen en gereed maken voor in te sturen.	3 uur		
Zondag				
	Doorlezen en kleine aanpassingetjes doen om pva in te sturen!	6 uur		

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 20			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Inlezen interview Chris Pronk om goede vragen aan Niek te stellen	1 uur		
	mail/ bel contact met UTS	T.b.v. Implementatie 2 uur		
Dinsdag	Interview opstellen voor afname met Niek van der Moolen	2 uur		
	Met Arjen Bos gesprek	1 uur		
Woensdag	Interview afgenomen met Niek van der Moolen	1 uur		
Donderdag	lezen literatuur	2 uur deze week		
Vrijdag	Opzetten gemaakt voor opdrachten die gemaakt moeten worden. Halve dag.	T.b.v. studiepunten 1 uur		
	Informatiestromenlijst en foto invoeglijst t.b.v. afstuderen gemaakt	4 uur		
Zaterdag	Diverse literatuur bekeken en administratie gedaan	3 uur		
Zondag	Interview uitwerken	5 uur		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 21			
DAG	Omschrijving			Verwijzing
Maandag	Interview uitwerken van Niek van der Moolen			3 uur
	Literatuurverslag opstellen grove vorm			3 uur
Dinsdag	Aanpassen bijwerken pva volgens mail Lenard week 20			2 uur
Woensdag	Workshop operationeel plan			2 uur locatie Bam Amsterdam UVA 1
Donderdag	Wat is Smart Building Logistics			2 uur
Vrijdag	Gesprek met Arjen Bos over plan van aanpak			1 uur
Zaterdag	Groeirapport aanvullen			6 uur
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 22			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Plan van aanpak klaar leggen en door nemen t.b.v. gesprek	2 uur		
Dinsdag	Plan van aanpak klaar leggen en door nemen t.b.v. gesprek	2 uur		
	Literatuur lezen en doornemen	1 uur		
Woensdag	Voorbereiding op gesprek met Lenard en met Arjen	2 uur		
Donderdag	Voortgangsgesprek met Arjen, Lenard en Sjacco	Locatie bouwkeet UVA 2uur		
	Wat is Smart Building Logistics	2 uur		
Vrijdag	Literatuur lezen en doornemen	3 uur		
Zaterdag	Geen werkzaamheden voor school gedaan dit weekend			
	wel de organisatie van de Dweil en Shanty dag georganiseerd.			
Zondag	Hiervan leer ik ook weer dingen dus wel nuttig.			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 23			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Literatuur door nemen	2 uur		
	Zoeken kijken literatuur	2 uur		
Dinsdag	Afspraak gemaakt voor interview met Rob van Kampen	1 uur		
Woensdag	Literatuur door nemen en verwoorden in literatuur document	2 uur		
Donderdag	Literatuur UTS lezen	2 uur		
Vrijdag	School dag diverse verschillende dingen gedaan. PVA, literatuurstudie, urenverantwoording en boeken terug gebracht.	8 uur		
Zaterdag	Groeirapport aanvullen	2 uur		
Zondag	Interview voor bereiden voor morgen (maandag 10-06-2013)	2 uur		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 24			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Interview houden met Rob van Kampen 15 uur	1 uur durend Kantoor Bam Ubouw regio Amsterdam		
Dinsdag	Zoeken kijken en analyseren literatuur	2 uur		
Woensdag	Literatuur UTS door nemen (management samenvatting)	2 uur		
Donderdag	Voorbereiding offerte bespreking van UTS	2 uur		
Vrijdag	Literatuur UTS door nemen (management samenvatting)	2 uur		
Zaterdag	Uitwerken interview van Rob van Kampen	5 uur		
Zondag	Interview nazien Rob van Kampen	1 uur		
	Plan van aanpak schrijven en nazien	5uur		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 25			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Plan van aanpak aanpassen en verfijnen naar een goed document	4 uur		
Dinsdag	Plan van aanpak goedgekeurd bevonden door Lenard en Jan Pieter	1 uur Verstuurd aan Ernest (zie de mails)		
	Gesprek met UTS over offerte	2 uur		
Woensdag	Literatuur UTS door nemen (management samenvatting)	1 uur		
	Literatuur zoeken en bekijken	1 uur		
Donderdag	Gesprekje met Ricardo Hartsink over bouwfasering	2 uur		
	Inhoudsopgave eerste aanzet gemaakt om structuur aan te leggen	1 uur (zondag heb ik dat gedaan)		
Vrijdag	Urenverantwoording, email ordenen en diverse administratie	1 uur		
	Door nemen boek snel afstuderen t.b.v. scriptie	1 uur		
Zaterdag	Interview voorbereiden Niels van Ginniken en Arnold van rijh	2 uur		
	Gespreksnotities schrijven van gesprekken die ik heb gehad met UTS 3 stuks	3 uur		
Zondag	Stroomschema bekijken en informatie zoeken en mindmap gemaakt	2 uur (map stroomschema heb ik gevuld met nuttige informatie)		
	Planning bekeken en mapjes gemaakt om steeds onderdelen bij te vullen	3 uur		

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 26		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Interview afgenomen met Niels van Ginniken	2 uur Kantoor Bam Amsterdam	
Dinsdag	Diverse documentatie opgezocht waaruit ik mogelijk informatie uit haal	2 uur	
Woensdag	Bespreking met Lenard Brokelman, hoe onderzoek aan te pakken	2 uur locatie Amersfoort 14:00 uur	
Donderdag	Schrijven/ conclusie literatuur	2 uur	
Vrijdag	Schrijven/ conclusie literatuur	3 uur	
Zaterdag	Valckenburg!		
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 27		

DAG	Omschrijving	Verwijzing
Maandag		
Dinsdag	Huidige logistiek beschrijven vanuit onderzoek/ analyse Interview gehouden met Arnold van Rijn	3 uur 2 uur
Woensdag	Huidige logistiek beschrijven vanuit onderzoek/ analyse	3 uur
Donderdag	Onderzoek naar werk fase 2, projectplan doornemen (groeirapport)	1 uur
Vrijdag	Groeirapport	2 uur
Zaterdag	Groeirapport	4 uur
Zondag		

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 28			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag				
Dinsdag	Onderzoek en analyse op papier zetten	3 uur		
Woensdag	Onderzoek en analyse op papier zetten	3 uur		
Donderdag	Informatiestroom	2 uur		
Vrijdag	Gesprek met Arjen: Offerte kijken en mijn bevindingen geven	1 uur dit is een belangrijke aktie!		
Zaterdag	Nieuwe logistieke aanpak projecten	4 uur		
Zondag	Groeirapport aanvullen	5 uur		
	Stroomschema informatie verzameld	3 uur		

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 29			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag		Aanvullen heb je nog wat gedaan? Analyse gedaan en verstuurd nazien wanneer?!!!!			
Dinsdag		Nieuwe logistieke aanpak projecten		4 uur	
Woensdag		Informatiestromen verzamelen en ordenen (mappenstructuur aanleggen)		2 uur	
Donderdag		Informatiestromen verzamelen en ordenen (mappenstructuur aanleggen)		3 uur	
Vrijdag					
Zaterdag					
Zondag					

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 30			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag		Vakantie niks gedaan			
Dinsdag					
Woensdag					
Donderdag		Boekje lezen over afstuderen		1 uur	
Vrijdag		Boekje lezen over afstuderen		1 uur	
Zaterdag		Boekje lezen over afstuderen		1 uur	
Zondag					

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 31		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Vakantie veel gedaan voor laatste studiepunten	elke avond 2 uur	
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag	Analyse aanvullen	3 uur	
Zondag	Analyse aanvullen	3 uur	

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen		week: 32		
DAG		Omschrijving	Verwijzing	
Maandag		Analyse aanvullen		3 uur
Dinsdag		Analyse aanvullen		3 uur
Woensdag				
Donderdag		Analyse aanvullen		3 uur
Vrijdag		Analyse aanvullen		5 uur
Zaterdag		Boekje lezen over afstuderen (snel afstuderen)		2 uur
Zondag		Boekje lezen over afstuderen (snel afstuderen)		2 uur

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 33			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Vakantie veel gedaan voor laatste studiepunten	Bijna elke avond 2 uur		
Dinsdag	Literatuur onderzoek maken conclusies	3 uur		
Woensdag	Literatuur versturen en even laatste keer kijken voor aanbeveling	1 uur		
Donderdag				
Vrijdag				
Zaterdag				
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 34			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Offerte beoordeling	5 uur implementatie		
Dinsdag	Werkzaamheden voor UVA 2 t.b.v. invoeren op project	2 uur		
Woensdag	Offerte beoordeling	2 uur		
Donderdag				
Vrijdag	Schooldag gehad. Opdrachten afgerond	8 uur		
Zaterdag	Eigenlijk niks aan school gedaan heb het 'te' druk gehad met werk			
Zondag	Moest tot einde bouw een planning maken. Welgeteld uiteindelijk 700 regels hierin is veel tijd in gestoken.			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 35			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Mailtjes verstuurd met PVA planning	Aan Lenard, Arjen en Ernest		
Dinsdag	Werkzaamheden voor UVA 2 t.b.v. invoeren op project	2 uur		
Woensdag				
Donderdag	Werkzaamheden voor UVA 2 t.b.v. invoeren op project	2 uur		
Vrijdag	Offerte beoordeling	2 uur		
Zaterdag	Eigenlijk niks aan school gedaan heb het 'te' druk gehad met werk Moest tot einde bouw een planning maken. Welgeteld uiteindelijk 700 regels hierin is veel tijd in gestoken.			
Zondag				

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 36			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Eigenlijk niks aan school gedaan heb het 'te' druk gehad met werk			
	Moest tot einde bouw een planning maken. Welgeteld uiteindelijk			
Dinsdag	700 regels hierin is veel tijd in gestoken.			
	Ontbijtsessie met omwonenden project UVA te Amsterdam	2 uur		
Woensdag	Gesprek met Arjen. Hierin is best wel wat besproken over hoe verder te gaan	2 uur		
	Afgesproken dat ik een planning maak tot einde afstuderen.			
Donderdag	Op het werk zeer druk i.v.m. met vakantie van Martijn Sijmons			
	Aanvullen groeirapport, terugverdienmodel	2 uur		
Vrijdag	Aanvullen groeirapport, terugverdienmodel	2 uur		
Zaterdag	Vrachten analyseren van fase 1	4 uur		
Zondag	Vrachten analyseren van fase 1	3 uur		

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 37			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Op het werk zeer druk i.v.m. met vakantie van Martijn Sijmons en Ton Hemels			
	Weekrapporten aangevuld wat ik gedaan heb			2 uur
Dinsdag				
	Aanvullen groeirapport, terugverdienmodel			2 uur
Woensdag	Gesprek met Arjen. Hierin is best wel wat besproken over hoe verder te gaan			2 uur
	Afgesproken dat ik een planning maak tot einde afstuderen.			
Donderdag	Samenvatting aanvullen van ontbijtsessie (in groeirapport)			1 uur
Vrijdag				
Zaterdag				
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 38			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Diverse mailverkeer met Remco van Barneveld over contracten	2 uur		
Dinsdag	Tijdsschema afstuderen maken	1 uur		
Woensdag	Aanvullen groeirapport, terugverdienmodel	2 uur		
	Gesprek met Arjen. Hierin is best wel wat besproken over hoe verder te gaan	Arjen heeft afgezegd niet door gegaan! Maandag week 39		
	Organisatieverandering bijgewoond in Volendam! Voorbereiding schooldag	3 uur		
Donderdag				
Vrijdag	Schooldag: onder andere gesprek met Lenard gehad tijdsad bespreking	8 uur		
Zaterdag				
Zondag	Gesprek voorbereiden met UTS: Arjen, Niek en Sjacco			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 39		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Gesprek met Arjen. Hierin is best wel wat besproken over hoe verder te gaan	1 uur	
Dinsdag	Afgesproken dat ik een planning maak tot einde afstuderen.	2 uur	
Woensdag	Gesprek met UTS 11:00 uur		
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag	Terugverdienmodel groeirapport uitzoeken en lezen	4 uur	

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 40			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag				
Dinsdag	voortgangs gesprek met Arjen	1 uur		
Woensdag				
Donderdag	Uitvoerdersvergadering: samenwerken opdrachtgevers en onderaannemers	2 uur		
Vrijdag	Analyse/ groeirapport voortgang	3 uur		
Zaterdag				
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 41			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag					
Dinsdag		Vorbereiding gesprekken met Arjen en Lenard		1 uur	
Woensdag					
Donderdag		Gesprek met Arjen 07:15 uur werk Amsterdam bouwkeet		1 uur Niet door gegaan Arjen is ziek waarschijnlijk een maand!	
		Gesprek met Lenard 17:00 uur Amersfoot		2 uur bespreking Masterproef van Ruben	
Vrijdag		Schooldag		6 uur	
		Nederland - Hongarije			
Zaterdag		Aanpassen extra toevoegingen tbv omrekenen palletplaatsen		3 uur	
Zondag		Aanpassen extra toevoegingen tbv omrekenen palletplaatsen		3 uur	

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 42			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Aanpassen extra toevoegingen tbv omrekenen palletplaatsen	3 uur		
Dinsdag	Documentatie plattegronden/ gevels verzamelen tbv gebruik scriptie	3 uur		
Woensdag	Anouk Gelredome	Niet door gegaan!		
Donderdag				
Vrijdag	Gesprek met Vincent van Driel telefonisch	1 uur		
Zaterdag				
Zondag	Analyse aanvullen met feiten van LCCC London en Masterproof bekeken van de heer Ruben, Arbeidsrendementen (mag hier feiten uithalen tbv scriptie)	6 uur		

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen		week: 43		
DAG		Omschrijving	Verwijzing	
Maandag		Aanvullen groeirapport en administratieve handelingen tbv afstuderen	2 uur	
Dinsdag		ABK door akkeren opzoek naar kosten terug halen >>> moeizaam		
Woensdag		Anouk Concert Gelredome		
Donderdag				
Vrijdag				
Zaterdag				
Zondag		Rekenmodel	4 uur	

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 44		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag	Problemen met begeleider, mogelijkheden met gezondheid		
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen		week: 45		
DAG		Omschrijving	Verwijzing	
Maandag				
Dinsdag		Rekenmodel		2 uur
Woensdag		Rekenmodel		2 uur
Donderdag				
Vrijdag				
Zaterdag		Rekenmodel		4 uur
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 46			
DAG		Omschrijving	Verwijzing	
Maandag				
Dinsdag		Reken model maken	2 uur	
Woensdag		Reken model maken	2 uur	
Donderdag		Reken model maken	2 uur	
Vrijdag		Reken model maken	2 uur	
Zaterdag		Literatuur lezen t.b.v. SBL	2 uur	
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen		week: 47		
DAG		Omschrijving	Verwijzing	
Maandag				
Dinsdag				
Woensdag		Gesprek gehad met begeleider en het lijkt erop dat het moeizaam is verder te gaan met hem.		
Donderdag				
Vrijdag		Aanvullen rapportage	8 uur	
Zaterdag		Aanvullen rapportage	6 uur	
Zondag		Aanvullen rapportage	6 uur	

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 48		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Scriptie schrijven	3 uur	
Dinsdag			
Woensdag	Scriptie schrijven	2 uur	
Donderdag	Belangrijk document verkregen ILP van Delft	2 uur	
Vrijdag	Scriptie schrijven	2 uur	
Zaterdag	Belangrijk document verkregen ILP van Delft	2 uur	
Zondag	Scriptie schrijven	4 uur	

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 49		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag	Literatuur lezen t.b.v. SBL	2 uur	
Donderdag			
Vrijdag	Bedrijfsbezoek bij Henk Lensink te Delft. Henk Lensink is bouwplaatsmanager bij Bam utiliteitsbouw grote projecten. Henk gebruikt bij project stationshal te Delft Smart Building Logistics. Anneemsom is +/- € 40 000 000.	3 uur	
Zaterdag			
Zondag	Verslag geschreven van gesprek met Henk	2 uur	

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)			 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen	week: 50			
DAG	Omschrijving	Verwijzing		
Maandag	Literatuur gelezen en verzameld van TNO	2 uur		
Dinsdag	Knoop door gehakt heb aangegeven niet verder te gaan met begeleider			
Woensdag	ivm ziekte. Ik heb een nieuwe begeleider op het oog die waarschijnlijk bereid is mij te helpen.			
Donderdag	Gesprek gehad met Arjen en meegedeelt dat ik niet meer verder kan en voor mezelf moet gaan. Arjen begrijpt dit en zegt zich niet volledig in te kunnen zetten denkt hij. Prima uit elkaar gegaan!	1 uur		
Vrijdag				
Zaterdag				
Zondag				

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 51		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Diverse dingen gedaan ordenen van materialen	2 uur	
Dinsdag	Voorbereiding gesprekken	2 uur	
Woensdag	Gesprek met nieuwe begeleider: Simon Ton, Senior projectleider bij Bam	2 uur	
	Utiliteitsbouw Amsterdam. Alles wat tot nu toe heb gedaan overlegd met hem.		
Donderdag	Gesprek gehad met Lenard Brokelman.	1 uur	
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag	Literatuur lezen t.b.v. SBL	2 uur	

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 																								
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw																										
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport																										
Onderdeel: Afstuderen	week: 52																										
<table border="1"> <tr> <td>DAG</td> <td>Omschrijving</td> <td>Verwijzing</td> </tr> <tr><td>Maandag</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dinsdag</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Woensdag</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Donderdag</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Vrijdag</td><td>Groeirapport aanvullen deze week</td><td></td></tr> <tr><td>Zaterdag</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Zondag</td><td></td><td></td></tr> </table>				DAG	Omschrijving	Verwijzing	Maandag			Dinsdag			Woensdag			Donderdag			Vrijdag	Groeirapport aanvullen deze week		Zaterdag			Zondag		
DAG	Omschrijving	Verwijzing																									
Maandag																											
Dinsdag																											
Woensdag																											
Donderdag																											
Vrijdag	Groeirapport aanvullen deze week																										
Zaterdag																											
Zondag																											

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 53		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 1		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)					
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw					
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport					
Onderdeel: Afstuderen		week: 2					
DAG		Omschrijving		Verwijzing			
Maandag							
Dinsdag							
Woensdag							
Donderdag							
Vrijdag							
Zaterdag							
Zondag							

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 3			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag					
Dinsdag					
Woensdag		Scriptie opstellen			
Donderdag		Gesprek met Simon Ton			
Vrijdag		School			
Zaterdag					
Zondag					

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 4		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag	Scriptie schrijven		
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 5		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag	Scriptie schrijven		
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 6			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag					
Dinsdag					
Woensdag		Scriptie schrijven			
Donderdag					
Vrijdag					
Zaterdag					
Zondag					

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw	
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport	
Onderdeel: Afstuderen		week: 7	
DAG		Omschrijving	Verwijzing
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag		Scriptie schrijven	
Donderdag			
Vrijdag		School	
Zaterdag			
Zondag			



Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 8		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag	Voortgangsgesprek/ proces met Lenard, Jan Pieter en Simon Ton	Goedgekeurd mag in maart afstuderen	
Dinsdag	Gesprek met Simon Ton		
Woensdag	Scriptie schrijven		
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 9			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag					
Dinsdag		Scriptie schrijven			
Woensdag					
Donderdag					
Vrijdag					
Zaterdag					
Zondag					

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw			
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport			
Onderdeel: Afstuderen		week: 10			
DAG		Omschrijving		Verwijzing	
Maandag		Gesprek met Simon Ton			
Dinsdag					
Woensdag		Scriprie schrijven			
Donderdag					
Vrijdag					
Zaterdag					
Zondag					

Naam: Sjacco Jaques		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)	
Klas: BMU 12.2		Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw	
Studentnummer: 471531		Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport	
Onderdeel: Afstuderen		week: 11	
DAG		Omschrijving	Verwijzing
Maandag			
Dinsdag		Inleveren scriptie	Op de Han
Woensdag		Presentatie maken	
Donderdag			
Vrijdag			
Zaterdag			
Zondag			

Naam: Sjacco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		 																								
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw																										
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport																										
Onderdeel: Afstuderen	week: 12																										
<table border="1"> <tr> <td>DAG</td> <td>Omschrijving</td> <td>Verwijzing</td> </tr> <tr> <td>Maarndag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinsdag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Woensdag</td> <td>Presentatie maken</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Donderdag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vrijdag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaterdag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zondag</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				DAG	Omschrijving	Verwijzing	Maarndag			Dinsdag			Woensdag	Presentatie maken		Donderdag			Vrijdag			Zaterdag			Zondag		
DAG	Omschrijving	Verwijzing																									
Maarndag																											
Dinsdag																											
Woensdag	Presentatie maken																										
Donderdag																											
Vrijdag																											
Zaterdag																											
Zondag																											

Naam: Sjaaco Jaques	Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)		
Klas: BMU 12.2	Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw		
Studentnummer: 471531	Onderwerp: Urenverantwoording/ weekrapport		
Onderdeel: Afstuderen	week: 13		
DAG	Omschrijving	Verwijzing	
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag	Presenteren scriptie		
Zaterdag			
Zondag			

9.12.1: Gesprekken



Gespreksnotitie

Aan	Lenard Brokelman l.brokelman@prc.nl , Arjen Bos A.Bos2@bamutiliteitsbouw.nl
Kopie aan	Jan Pieter van Dalen j.vandalen@nieman.nl , Ernest Boel info@ernestboel.nl
Van / opsteller	Sjacco Jaques
Datum / tijd / locatie	20-03-2013/ om 13:30, Bouwkeet werk UVA (Universiteit van Amsterdam)
Blad	1 van 2
Bespreking	Kennismakingsgesprek (onderdeel Afstuderen)

Gespreksnotitie van kennismakingsgesprek tussen Lenard Brokelman vanuit de Han als eerste begeleider, Jan Pieter van Dalen als tweede begeleider vanuit de Han (niet aanwezig), Arjen Bos vanuit Bam Utiliteitsbouw als bedrijfsbegeleider en Sjacco Jaques als student van de Han en werkzaam bij Bam Utiliteitsbouw.

Doel van het kennismakingsgesprek is om elkaar te leren kennen (voorstelronde), wie wat moet doen, waar werkzaam, uitgangspunten en 'formele' kant van het afstuderen toe te lichten.

Lenard Brokelman legt uit hoe en wat er moet gebeuren en wat er verwacht wordt van een allen. Hieronder heb ik de zaken opgesomd wat besproken is tijdens het overleg:

- Vanuit de Han zal er een tweede begeleider zijn die als het nodig mocht zijn als vervanger zal fungeren. Tevens is de tweede begeleider (Jan Pieter van Dalen) er voor het mede beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de student (Sjacco Jaques) op basis van HBO niveau;
- Lenard Brokelman geeft uitleg over de 'stappen' die gemaakt moeten worden op volgorde te weten: A4tje projectvoorstel, Plan van Aanpak (pva), literatuurstudie, scriptie en presentatie.
- Sjacco geeft aan nog geen PVA gemaakt te hebben wel een planning waarin in grove lijnen te zien is wanneer en hoe het afstuderen aangepakt wordt;
- Afgesproken is dat er elke twee á drie weken een gesprek is tussen Lenard Brokelman en Sjacco Jaques plaats vindt. Dit om de voortgang bij te houden van het verloop van afstuderen. Halverwege het afstuderen zal er een moment zijn dat er met de eerste begeleider vanuit de Han, tweede begeleider vanuit de Han en bedrijfsbegeleider (Bam) een gesprek (tussentijdse thermometer) hebben over de voortgang. Tevens zal er een inschatting gemaakt worden of de streefdatum gehaald kan worden voor het afstuderen.

Arjen Bos vraagt wat er vanuit de HAN van de bedrijfsbegeleider wordt verlangd?

Lenard Brokelman geeft aan dat de voortgang en de doelstelling gehaald wordt wat er vanuit het bedrijf verwacht wordt. Dit slaat met name op het praktische gedeelte. Kortom het begeleiden en in 'de gaten houden' van de voortgang van de student en geleverd werk. Het PVA is hierin met grote mate een belangrijk document waarin de doelstelling en afbakening komt te staan.

- Arjen geeft aan dat vanuit de Bam verwacht wordt dat het zogenaamde SBL (Smart Building Logistics) ingevoerd gaat worden op project UVA te Amsterdam (fase 2);
- Dat voor het werk al een Bim model gemaakt is;
- Dat er vanuit Sjacco voor de afbouw een plan klaar ligt om invulling te geven voor UVA 2.

De kwaliteit van het geleverde werk van de student, of het HBO-waardig is zal door de begeleiders bewaakt worden (zowel vanuit de Han en Bedrijf).

Sjacco vraagt hoe en wat er gedaan moet worden omtrent urenverantwoording?

Lenard Brokelman geeft aan dat de uren die gebruikt worden t.b.v. het afstuderen bij gehouden moeten worden. Verder is het belangrijk dat er verslaglegging/ gespreksnotities gemaakt worden door de student van de gesprekken die plaats vinden.

Lenard Brokelman geeft aan dat er van de student een reflectie van de *student* zal plaats vinden. Dit zal in het verslag als bijlage toegevoegd worden. Kort en bondig zal hier in moeten komen te staan hoe de student het afstuderen ervaren heeft, hoe en of de doelstellingen omschreven in pva en planning behaald zijn.

Lenard Brokelman vraagt naar de gegevens van Arjen Bos?

Arjen Bos zal zijn gegevens toe sturen aan Lenard Brokelman.

Aan	Sjacco Jaques
Aanwezig	Ricardo Hartsink, Arjen Bos, Mark van de Heijden, Sjacco Jaques en Lodewijk Bosscher
Van / opsteller	Sjacco Jaques
Datum / tijd / locatie	02-04-2013 09:00 uur Bam keet Valckenierstraat Amsterdam
Blad	1 van
Bespreking	UTS bespreking nummer 1

Beste Arjen en Ricardo,

Heb contact gehad met UTS, te weten Lodewijk Bosscher.
 Op de korte termijn heb ik een afspraak kunnen maken voor dinsdag 09:00 uur op het werk UVA.

Uitsluitend UVA's, niet de HvA's, zijn er. Het is niet mogelijk om de UVA's te krijgen.

Heb met Lodewijk afgesproken dat er al wat gegevens opgestuurd zouden worden.
 Arjen kun jij dit regelen, te denken valt aan algemene gegevens, projectgegevens en planning.

Kunnen jullie even laten weten of jullie kunnen op dit tijdstip?

Sjacco Jaques
 Uitvoerder
 0612980648

Kennismakingsgesprek tussen Bam en UTS.

Na een voorstelronde waar iedereen aan geeft wat zijn taken zijn legt Mark van de Heijden uit wat SBL is en hoe het ontstaan is.

Vooraf een informeel gesprek met aanzet tot concrete afspraken wat wie moet aanleveren.

Aanleveren documenten door Bam:

- M2 materiaal lijsten;
- Logistiek plan van UVA 2;
- Algemeen tijdschema;

Aanleveren/ akties UTS:

- Voorbeeld van een m2 staat van ander werk.



Sjacco Jagers (BAM) Vincent van Driel
Aygen Bas (BAM) Tarstan Thomas Tiet
Mark van de Heyden (UTS)

Kantoor: Bureau Amsterdam
UTS bespreking 2

Sjacco Jagers

1 3
afstuderen
22-05-2017

- ✓ Levering door BAM
- o n^1, n^2 Rec A. ✓
 - o Platteborden ✓
 - o Logistiek plan fase 2 ✓
 - o

- N Levering door UTS
- o Verwachtings document ✓
 - o Handleiding striet aan weeg
 - o Ke getallen. striet aan weeg.
het is niet gekregen.

- ✓ Hoe start je jullie een werkh op? ✓
- ✓ Hoe verloopt de afspraak met onderaannemers en leveranciers? ✓
- ✓ Kunnen jullie een presentatie houden? ✓

23-04-2023

- ✓ Geen goede contacten met Sita → Sherkas. njsal
- Logistiek uit voeren → wat is zijn taak?
- Budget wat costelationen.
- ✓ Focus op opbrengst
- ✓ Met onderaannemers voor SBL.
- ✓ Hoe ga je er mee om met contracten zijn.
- ✓ Jullie zijn ook nog leende UTS.
- Gent de Greve van stadshantoon deelt. (Bar)
- ✓ Van zoude grootste opbrengst zit in de arm van de mannen → Leen Stigter
- ✓ Chris prout: Ontbijt sessie kancijfers bepalen.
Hien a en presentatie van.
- ✓ Bouw ticket systeem moet volledig gekruist te worden
- ✓ Inzicht in planning.
- ✓ In contractvorm meenemen dat een trailer weg gestuurd wordt.
- Twee logistieke scenario's door elkaar heen.
 - ↳ De noodzaak van twee projecten. Fase 1+?
 - ↳ Moet fase 1 mee?

Aan	Sjacco Jaques
Aanwezig	Sjacco Jaques, Arjen Bos, Mark van de Heijden, Tristan Thomas en Vincent van Driel
Van / opsteller	Sjacco Jaques
Datum / tijd / locatie	23-04-2013 Kantoor Bam Utiliteitsbouw regio Amsterdam
Blad	1 van 2
Bespreking	UTS bespreking nummer 2

Gesprek over wat er nodig is en wie wat aan zal leveren om een samenwerking tot stand te brengen en daarmee een eerste prijs te generen.

Stand aangeleverde documenten door UTS:

- Verwachtingsdocument;
- Handleiding;
- Kengetallen (niet aangeleverd dit zal Mark nog doen aan de hand van een gehouden ontbijtsessie)

Stand aangeleverde documenten door Bam:

- M2 lijst UVA 2;
- Plattegronden (ingekleurd met baches);
- Logistiek plan fase 2 (UVA 2)

De documenten die ontvangen zijn worden hebben we door genomen. UTS geeft aan de documenten verder door te nemen en Jaco geeft aan als er vragen zijn via de telefoon of email kenbaar te maken.

Aantal vragen door Sjacco:

Hoe starten jullie een werk op? Gegevens die verkregen zijn worden door genomen en vanuit hier kan UTS een prijs maken. Dit doormiddel van het berekenen van de aantallen zogenaamde pallet plaatsen.

Hoe verloopt de afspraak met onderaannemers en leveranciers? Hier heeft UTS geen eenduidig antwoord op maar geeft aan dat er met de Lean sessies aangeschoven wordt om zo de onderaannemers en leveranciers te woord te staan.

Kunnen jullie een presentatie geven voor de leveranciers en onderaannemers?

UTS geeft aan dit geen probleem te vinden, dat willen ze doen.

Aantal vragen door Arjen Bos:

Hoe moeten we voor UVA 2 onderaannemers en leveranciers overtuigen om samen te werken? Mark geeft aan dat als er al contracten zijn gesloten met de onderaannemers het zeer moeizaam is om dat te doen. Niet onmogelijk geeft Mark aan. Arjen probeert door te vragen alleen krijgt geen eenduidig antwoord!

Arjen geeft aan zich altijd te richten op opbrengsten! Waar zitten de grootste opbrengsten? Mark geeft aan dat de grootste opbrengsten zitten in de uren van de bouwplaatsmedewerkers. Hiervoor kun je Leen Stigter benaderen.

Welke projecten kunnen wij benaderen? Stads kantoor Delft geeft Mark aan, te weten Gert de Greve.

Op UVA twee is een misschien wel bijzondere situatie, Arjen geeft aan dat er twee fases door elkaar heen lopen namelijk UVA 1 en UVA twee. Hoe gaan we hiermee om hebben jullie ervaring? UTS geeft aan dat de twee projecten moeten samenwerken en niet dat de één wel UTS doet en de ander niet. Dat wil zeggen m.b.t. het gebruiken van het ticket systeem.

Vragen vanuit UTS:

Zijn jullie bekend met het zogenaamde bouwticket systeem? Sjacco geeft aan dat dit systeem bij UVA 1 wordt gebruikt. Deze wordt niet volledig benut geeft Sjacco aan en legt uit: Tickets worden gemaakt, planning wordt nauwelijks gemaakt, kosten programma die eraan vast zitten worden niet gebruikt en er wordt nog teveel 'vrij blijvend' met de tickets omgegaan.

Tristan (ontwikkelaar ticket systeem vanuit JUBI) geeft aan dit wel een keer te willen uitleggen om een wat helderder beeld te krijgen en geeft aan dat hij volledig gebruikt moet worden anders heeft het systeem geen zin!

Lopende het gesprek kwamen de volgende feiten naar voren.

- UTS geeft aan dat de relatie met Sita niet goed is. Mark van de Heijden geeft aan diverse gesprekken gehad te hebben met Sita om samen te werken. Hij geeft aan dat Sita niet wil dat logistiek uit handen gegeven wordt. Bam heeft contracten met Sita zijn vaste Partners!
- UTS geeft aan nog lerende te zijn en dat er naarmate er werken gedaan worden ervaring opgedaan wordt.
- UTS heeft een presentatie van een zogenaamde ontbijtsessie waar kengetallen in staan, deze zal Mark naar Arjen sturen.
- UTS geeft aan dat er in contractvorm moet staan dat vrachtwagens terug gestuurd worden als ze geen ticket hebben.
- UTS geeft aan faciliteren te zijn.

Afspraken UTS:

- Prijs opstellen aan de hand van gegevens;
- Locatie bezoek doen op het project.

Afspraken Bam:

- Planning ATS aanleveren;
- Afvalstromen geschatte hoeveelheden door geven;
- Afspraak maken voor door nemen m2 staten (Sjacco);
- Bouwdeel fases aanleveren;
- Uitnodiging voor vervolgspraak sturen 22-05-2013.

Input van Bart

- Sjacco : Door nemen Hoe veelheden.
afvalstromen (geschatte bronnen)
rekeningen. van Docstream l.
Logistiek plan. l.
Locatie bezoeken. (Ricardo)
Bouwdeelfases toelichten (Sjacco)
planning (ATS) (Anjem)
planning Logistiek laten bijpraten.

* Uitnodiging versturen voor woensdag 22-05-2013

* Logistiek plan door nemen met Locatie bezoeken

- Materieel van Bart gaat naar UTS
- ↳ Sita zal een keuronderzoek moeten worden
↳ 5/6/7 cm per m².
- ✓ afvalstromen is nog een moeilijke maar wel van belang
- ✓ het verscht volgens een "Logistiek"
- uit alle punten worden een budget gemaakt
↳ UTS moet goed namems de aannemers
dat is van belang
- ✓ Logistiek transport te maken.
- UTS is meer (focuserend)
- voor afval onderzoek getoetst worden

Localisatiebezoek en onze wetelijke afspreek
 Onze wetelijke afspreek af. Jaccotegou

02-05-2013

Locatie: Reinder zielehuis te Amersfoort

Deelnemers: Gerard Broekman, Jan Pieter van Dijke en Jaccotegou

- o Rail door nemen
- o pva door nemen deze wil ik definitief maken
- o Implementeren op project UWA 2. (logische stappen)
 - ↳ Handboek maken (door middel van veld onderzoek)
 - ↳ giten informatie in het principe van het meest nog niet bekend
- o Nacontrollen en aanbevelingen door voeren in handboek
 - ↳ se was ook al bestaand
- o Hoe moet je een scriptie schrijven?
 - ↳ alles verzamelen en dan gaan schrijven?
- Wat is een logische volgorde?
- Heel veel werk achter de schermen!

Wat hoe wanneer

- ✓ tot op de minuut gemiddeld of tot baanplaats.
- ✓ Door vover voor Mervreun
- ✓ Diepgang met Cole studie om zo kosten te berekenen
- ✓ Handboek met stroomschema's om te zien of een project geschikt is
- ✓ probleem: de kaart wordt gevoerd
- ✓ Concept door ontwikkelen

kan ik bestaande werkplan aanpassen ingegreide

opbrengsten. bijvoorbeeld met deuren.

WVA te Amsterdam
PVA + vervolg afstuderen bespreken

Sjacco
Jugues

30-05-2013

Dan verg Sjacco Jugues
Anjen Bos.
Lenard Brokelman.

* plan van aanpak

- ✓ Bespreken mail Lenard Brokelman. (8)
- ✓ PVA bespreken wat moet eruit en of doevragen? (7)
- ✓ Hoe moet ik aanpakken tot definitief stuk waar "wij" achter staan?
- ✓ moet de WVA het goed heuren of alleen u Lenard?

* Literatuur / Documentaire

- ✓ Interview 2 afmaken + 2 week 23 (17)
- ✓ Literatuur die ik gebruik. (12)
- ✓ Literatuur verslag die ik steeds aanvul goed of niet? (12)

* Analyse / Onderzoek

- ✓ Interview afmaken (17)
- ✓ Wat is smart Building → zie plan van uit literatuur (17)
- ✓ rail van nagen uitroeten nieuwe logistiek (20)
- ✓ nieuwe logistiek: We zijn bezig met 17^e state + veranderen wat de geleend moet worden van voor korten/Bate een prijs te krijgen
Leren uit literatuur punten die in nieuwe handtekening moet worden te staan
(21) (22) (23)

Aan	Sjacco Jaques
Aanwezig	Vincent van Driel, Mark van de Heijden, Sjacco Jaques, Arjen Bos en Ricardo Hartsink
Van / opsteller	Sjacco Jaques
Datum / tijd / locatie	18-06-2013 14:00 uur Valckenierstraat Bam keet
Blad	1 van
Bespreking	Bespreking UTS 3

Doel van de bespreking is de offerte die gemaakt is door UTS vanuit de gegevens van Bam te bespreken en door te nemen.

Stap voor stap neemt Mark van de Heijden de offerte door (integraal logistiek plan project UVA 2). Het werd een interactief gesprek en bij sommige punten wordt stil gestaan.

Uitgangspunten offerte van UTS:

- Volle vrachten aanleveren;
- Niet elke dag naar bouwplaats rijden;
- Bouwticketsysteem gebruiken;
- Logistiek wordt eigenlijk overgenomen door UTS;

Uitgangspunten/ feiten na het bespreken van de offerte:

- Het bedrag van de offerte is te hoog. Er zal naar mogelijkheden gekeken moeten worden om dit te verlagen naar een acceptabel bedrag wat past op UVA 2.
- Komt naar voren dat we eigenlijk niet weten wat logistiek kost geeft Mark van de Heijden aan. Arjen geeft aan dat hij het er niet geheel mee eens is.
- Arjen geeft aan dat feitelijk nog geen contracten zijn gesloten op UVA 2, dit biedt perspectief voor het 'onderhandelen' met onderaannemers.
- Gert Greve benaderen, hij kan uitleg geven hoe een project offerte is afgesloten op project.
- Afvalscheiding is nog een lastig punt, hiermee moet er nog 'gebrainstormd' worden.

Hoe weten we of dit de prijs is vraagt Arjen? Hier gaat UTS een beetje 'flexibel' mee om, antwoord is niet helder blijft zweven. Als planning uitloopt kan dit gevolgen hebben voor de prijsstelling.

Draaiknoppen om tot een lagere offerte te komen vraagt Arjen?

- Afvalstromen, hierin kan nog een hoop mee gebeuren om prijs te laten zakken;
- Inkoop rechtstreeks vanaf de groot handel in plaats via een tussen handel;
- UTS geeft aan verkeersregelaar overbodig;

- Bouwtijdverkorting;
- Productiecapaciteit omhoog (30 minuten meer geeft UTS aan);
- Vervallen van logistiek Uitvoerder;
- Logistieke loops verminderen van 132 naar bijvoorbeeld 110;

De punten hierboven opgesomd zijn punten waar de mogelijkheden liggen om de offerte te verlagen. Mark geeft aan dat de voordelen ook in elementen zitten die niet zichtbaar zijn op het eerste gezicht en omdat sommige onderdelen niet gemeten worden.

- Te denken valt aan wat logistiek eigenlijk kost;
- Inzichtelijk hoe lang personeel bezig zijn met spullen naar de werkplek te brengen;
- Co 2 uitstoot, dit wordt nog niet gemeten;
- Hoeveel keer vrachtwagens nu rijden van en naar de bouwplaats;
- Onderbezette vrachten;
- Overlast voor omgeving wordt niet gemeten laat staan wat het kost, dit is zeer moeilijk omdat te meten.

Arjen gaat kijken waar de mogelijkheden liggen om de prijs naar beneden te krijgen en maakt een vervolg afspraak voor het bespreken van de offerte.

Gesprek met Leonard Biedeman (voetganger)
 Over belangrijke aspecten. Sjacco
26-06

1/
 240 bestel.
 26-06-2013

- Q planning behyken met stappen
- B Zeer veel tijd bezig met implementatie wel nuttig
- Q Heeft u een soort stappen plan?
- ↳ heb nu zeer veel informatie maar hoe te verwerken?
 Leonard
- Q Huidige logistiek procesbeschrijving
 stappen plan.
- B Nieuwe logistiek procesbeschrijving.
 stappen plan.
- Q vergelijking ca de Hand van een soort matrix?
- B Eigenlijk verhaal schrijven?
- ↳ voor's en tegen's

↳ matrix

↳ vergelijk tabel.
- Q nu al een plan hoe te doen heeft u ericht lijn?
 van wat bam piece.
- B Stappen hoe verover

computer of gewoon schrijven

Verdengsgesprek

Sjacco
Teges.

08-07-2013

- planning behjken aa de hand van stappen
- Implementatie hoe verder?
 - Heb je als context of geronen.
 - Wanneer op pablen.
 - Jh bes gebeld moon hoar dat j j nog niks hebt loka weten.
- Heb nu zeer veel informatie hoe in een "net".
Cnet.
- Kluidige logistiek proceetshrijving. en of stappenplan
- Nieuwe logistiek proceetshrijving en of stappenplan
- Vergeljk aa de hand van neten? of vordijk.

Eigenljk een verhaal schrijven. over nieuw e oud

- neten

- voor's en tegen's

- Stappen hoe verder
- Contracten bes j j en een paar hoe nagegeld?


UVA Amsterdam
markt gysgesprek
Sjacco r. Ryz.

Sjacco
Sjacco

kosten
€534,462

Baten
(75000 afval)

Wat kost logistiek nu? ABH?
hoe kan dit rechtelijk gemaakt worden?
kan ik van UVA 2 dit formuleren

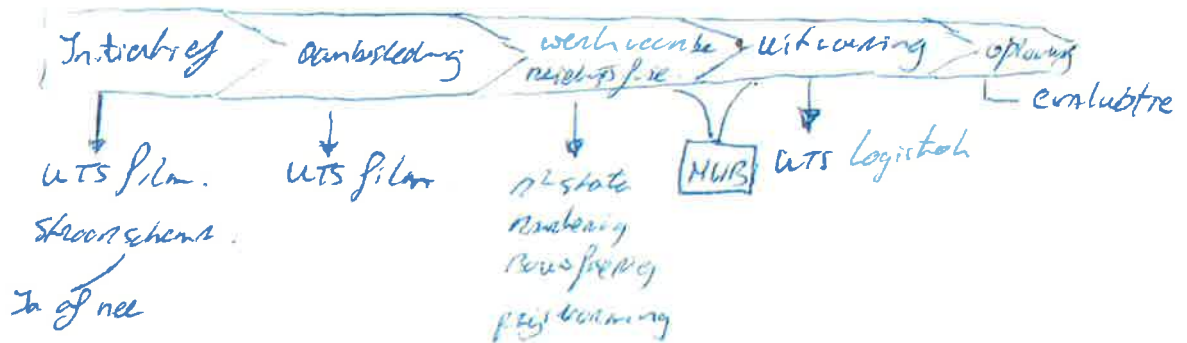

Alte

(Conceptmanager)

Alte

Honk leucings de lte → Belen

Alte

reerwerk hoe moet ik doen met de garen

Scherp naar offertes kijken → oekling zoeken

Styrobekken 70 pallets

Onderverandering A+B onderaan nemen uitroelen. en deling te zoeken

Naar v.d. lagere prijzen bij succes toe
besparing kosten UTS succes toe

In	Uit (5,5 / UTS)
* Afval 50% reductie * Verkeersregeling * Bpm redewerken * Inkoop groot handel * productieve verhoging redewerken * Minder vrachten * 30% → i.p.v. 40% pallet plaatsen ?? * Inhoudsteen rechtsreeks in hoop	€ 534 u62

- * Hoe kunnen we de € 534, u62 kosten delicaat krijgen?
- * De dankschrijven die we en zijn heeft door cijfers van?
 - * Het name om met argumenten te komen naar onder aannemen → zie Eric Leyten
- * En de geen meer overgenomen te kunnen we de krijgen hoe is de ervaring met de markt in 2017? dat we niet voor overname hebben te staan?
- * Hoe berekenen jullie de pallet plaatsen door het niet uit?

Jaques, Sjacco

Van: Bos, Arjen
Verzonden: woensdag 6 november 2013 9:25
Aan: Jaques, Sjacco
Onderwerp: Re: Vragenlijst logistiek Sjacco Jaques

Sjacco,

Ik heb je inmiddels al best een lange periode niet meer gesproken. De reden hiervoor is dat ik ziek ben. Ik blijf de ziekte van Lyme te hebben en zit aan de medicijnen. Dit verklaart wel waarom ik me al enkele maanden steeds slechter ging voelen. Wanneer ik weer hersteld ben kan ik op dit moment helaas niet zeggen. Maandag hoop ik van de internist meer te horen. Dan moeten we ook maar kijken of iemand anders jouw verder moet begeleiden, of dat ik dit weer kan oppakken.

Ik spreek je later, ben je in ieder geval op de hoogte.

Gr Arjen

Van: Jaques, Sjacco
Verzonden: Tuesday, November 05, 2013 10:33 PM W. Europe Standard Time
Aan: Jaring, Nick; Geest, Mark van der; Ton, Simon; Hemels, Ton; Sijmons, Martijn; Beusekom, Richard van; Bakker, Jan-Willem; Barneveld, Remco van; Hartsink, Riccardo; Kolk, Ron van der; Smit, Luc; Bos, Arjen; seldenrijk@aboma.nl <seldenrijk@aboma.nl>; Beek, Gerard van de (UBW); Graafmans, Ted; Tuil, Luco van; Krijger, Henk de; Tol, Jan van; Meijer, Nick; Kaijser, John; Brinke, Hans ten; Herbrink, Nikkie; Dilweg, Henk (ADMBW)
Cc: s.jaques@upcmail.nl <s.jaques@upcmail.nl>; Jaques, Sjacco
Onderwerp: Vragenlijst logistiek Sjacco Jaques

Beste Allen,

Momenteel ben ik bezig met een onderzoek naar "nieuwe logistieke aanpak projecten", dit ter afsluiting van mijn studie. Hiervoor zou ik graag jullie mening verkrijgen.

Hierbij in de bijlage een vragenlijst/ enquête over logistiek, met name Smart Building Logistics (SBL). Zouden jullie deze willen invullen en terug sturen aan mij? Het invullen zal +/- 10 minuten in beslag nemen!

Bij voorbaat dank.

Sjacco Jaques

(Management samenvatting)

- BLZ 4 Hande cijfers te behalen met inkoop?

- logistieke procesoptimalisatie waardoor hogere productie om meer rendement wordt gehaald
- hierbij wordt ook op gehaalde facturen vermindering.

- BLZ 6 productieverhoging
Via inkoop en onderhandeling zichtbaar gemaakt te worden.

- BLZ 8 hogere leveranciers hoe is deze te bereiken
om heel veel partijen te maken en te leveren
of krijgen we hierdoor een veel pallet plaatsen?

• Hebben jullie inmiddels toegelaten van projecten?

• Als ik deze heb kan ik hen we verder

• of Ervings getallen? van andere wete?

↳ ga van al deze dingen
ontwange zal toch echt
van Ben moeten horen het
het idee.

UTS Begeleiding

- Raosdon heeft ~~toen~~ contact met vloeren.
- Voor aanbesteding met een tender
- Eric Leyten ~~inlopen~~ BAM contact met opmerken
(ook RARC)
- Sander oude Knd → projectbegeleider
→ hant bij voortbeld ~~aan~~ twee keer in de week

- * RARC Klein platen → presentatie
- * RARC bouw → UTS heeft een opstelplaats parkeer
regelt. het door UTS in zelf is dit
mislukt omdat UTS ook in zelf is.
- * Ten-spacten en ryden nu veel en kunne via UTS
minder vuchten volle vuchten worden opgesteld
by UTS.
- Norme open breken

- And vaten voor
- U. weet niet precies wat je nodig hebt
-
- ⊕ afspraak maken tussen Mark van Heyden en met
Nijzen + Sjacco en Renee Boonveld.

Aanlevering door RARC:

- * Lijstje ~~aan~~ met punten
- * Eric Leyten contact opnemen belangrijke
- * Leidraad voor een presentatie (strategie ten voren)
- * π^2 staat (formel) →
- * model presentatie

Afstuderen.
Voorvangsgesprek met Arjen.

Sjacco.

41
Do 10-10-2017

(viel door gegeven Arjen is rich.)

- Heb je geheten naar analyse?
- Vanmiddag gesprek met Lenard.
- Vanuit analyse + overige gegevens ga ik de scriptie schrijven → vanuit dat richtoek naar antwoorden.
- Begroting door sheren (RBL) hierin zie ik wel wat maar nog niet de "spijlen op de kop"
Slijf nu kniel gissen en zoeken
- Vanuit de presentaties ga ik de scriptie aanvullen.
- Het herten verhaal is lastig maar hoop toch wel vanuit de presentaties wat meer "wijs" te worden.
- pallet plaatsen is lastig terug te nemen.
 - terug reken naar planning hoe lang benodigd?
 - NS bepaling alles opent maar waarom niet volle pallets.
→ Vincent bellet?
- Document B3 laten era met verzending hiermee kan ik veel in fondie verzamelen en "verhaal" schrijven.

1/1

3 wekelijkse bespreking
gesprek met Leonard

Sjacco

11-10-2013
Donderdag.
Leonard thuis in
Amersfoort.

Besprekingspunten met Leonard:

- * Bina moet afspraak maken met Arjen/Leonard en Sjacco.
- * Arjen Bor is ziek en Sjacco veel met het welzijn
dit gaat duren.
- * Th had veel uit een gesprekje met Arjen moeten
hebben! Sjacco geeft aan dat hij met Arjen
elke week ± 30 minuten zit om e.e.a. te
bespreken.
- * Voorkeuring + de gegevens die nu verspreid
zijn en naar toe te werken om scriptie te gaan
schrijven geeft Leonard aan Sjacco sluit
zich hierbij aan en denkt dat als er wat
te kort aan gegevens zijn onder tussen terug te
zoeken als hij de scriptie schrijft.
- * Afgegeven door Leonard + moet bespreken:
 - Proefproef Van Houtlandt Reizen >>> Invloed
van logistiek op arbeidsrendementen en de algemene
werkorganisatie: Het verbeteren hier van door
aanpak een gedreven (door), alsook doordachte aanpak
- * Th moet gegevens gebruiken met Bronvermelding!
- * Leonard zal in week 42 nog ca. volledige gegevens sturen
met onderzochte cijfers van arbeidsomstandigheden en
een afbouwmanoeuvre met betrekking op logistiek.


Afspraak met Lenard

Onderwerp: Algemeen voortgangsgesprek tussen Sjacco Jaques en Lenard Brokelman

Scriptie volgorde

Sjacco geeft aan dat hij is gestart met het schrijven van de scriptie. Analyse, documenten en diverse heeft Sjacco in zijn bezit en denkt hiermee voldoende te hebben om een goede start te kunnen maken met het schrijven van de scriptie.

- Inhoudsopgave besproken met Lenard. **Sjacco heeft ook een alternatief laten zien zoals hieronder is aangegeven. Dit zou per deelvraag een hoofdstuk kunnen zijn. Mogelijk alternatief voor inhoud scriptie.**

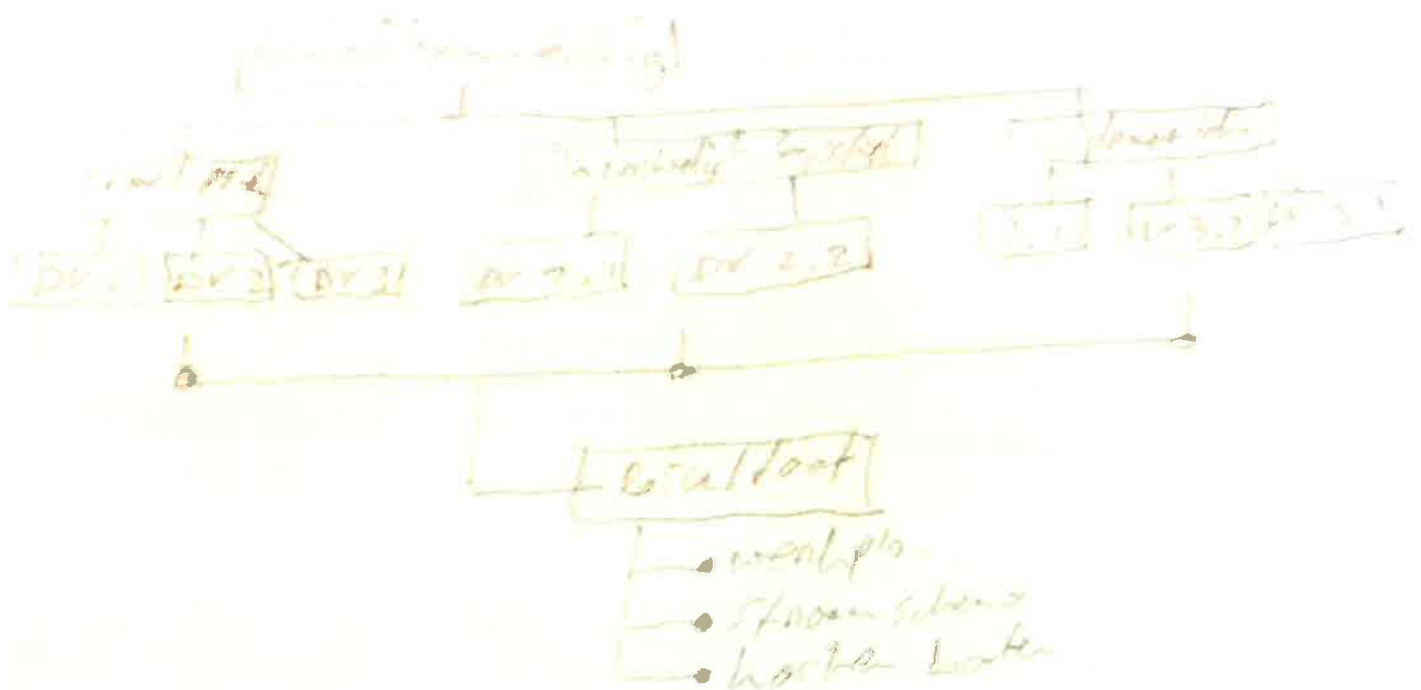

- Sjacco zal de inhoudsopgave en eerste gedeelte van de scriptie insturen aan Lenard. **Zodat Lenard e.e.a. kan beoordelen. Aanlevering: per fase en of hoofdstukken aanleveren!**

Kopiëren en plakken

- Sjacco geeft aan dat er een onderzoek vanuit London beschikbaar is. In het document/onderzoek is een belangrijke conclusie, medewerkers op een project die gebruik maken van een soort gelijk proces als SBL een productiviteits-verhoging van 25 minuten per dag kunnen realiseren. Zou dit een mogelijkheid zijn om deze conclusie te gebruiken voor de kosten/baten analyse?!

- Kan ik overnemen uit andere voorbeelden (zoals voorgaande beschreven stuk vanuit London)? Ja, mits goede bronbeschrijving i.v.m. het controleren door de HAN.

Besproken punten tijdens overleg

Algemeen de voortgang besproken van het afstuderen.

Er zijn twee 'problemen' die het afstuderen in de weg zitten.

1: Begeleider van Sjacco heeft de ziekte van Lyme en is hierdoor hoogstwaarschijnlijk niet meer beschikbaar als begeleider vanuit de Bam de komende tijd.

2: Het project UVA 2 ligt nog steeds stil, geen idee wanneer project zal gaan starten. Mogelijk probleem dat monitoren geen doorgang kan hebben op project UVA 2. *Hierdoor kan de voorgenomen vraag niet beantwoord worden om te monitoren en het werkplan te optimaliseren.*

- Binnenkort afspraak maken met Lenard en begeleider (Bam). Nog niet bekend of dit Arjen Bos zal zijn ivm ziekte. Sjacco zal week 47 contact opnemen met Arjen om te weten te komen of Arjen nog als begeleider beschikbaar kan zijn. Anders zal Sjacco nieuwe begeleider moeten zoeken.
- Henk Lensink (bouwplaatsmanager Bam) heeft een project waarbij SBL wordt toegepast in de praktijk geeft Sjacco aan, hieruit kan ervaring gehaald worden. >>> Sjacco zal contact opnemen met Henk Lensink om naar de mogelijkheid te kijken om toch e.e.a. in de praktijk te kunnen toetsen. i.v.m. de stillegging door asbestperikelen van werk UVA 2.
- Afstemmen hoe Sjacco, Jan Pieter van Dalen (tweede begeleider) op de hoogte moet houden. In principe alles met Lenard bespreken en toesturen, omdat Lenard eerste begeleider is. Plan van aanpak heeft Jan Pieter in zijn bezit.
- Sjacco zal gegevens vanuit onderzoek uit London toesturen aan Lenard.
- Planning door gesproken met Ernest, Lenard en Jan Pieter. Afstuderen (presentatie) op de 26-03-2014, inleveren scriptie **11-03-2014**.

Begruiping Henk Lensink. Delft.

SAL - afstudeeronderzoek

Sacco Jij

2/4

06-12-2013

Blauw is een woord van Henk Lensink

✓ Het went. Wil je nog stil en wel niet af te laten monitoren

✗ Interview afnemen is dat goed? *

- Het "normale werkplan" is vrij algemeen
is het ILP wel afdoende? *

→ aanleveren materiaal stoot

→ elementen van

→ welke onderdelen uit het plan mis je?

- Hoe loopt proces af na aanvraag?

- hijgen jullie se onder aanemers mee?

→ welke se mee? overtuigen voordat la.

→ wat kun je bij onderaanemers weg halen? 1/5

→ Hebben jullie contact onder verdeeld? de vind ik lastig

- Ik heb voor project ook een kosten/baten analyse
heb jij die ook van dit werk zelf? *

De business case is moeilijk hoe worden we anders
veranderen aanpakken en hoe geld "weg" gaat

→ heb je ook gezien om de kosten te dalen?

nee dit heeft bleek nog niet meer wel.

→

2/4

Bedrijfsbezoek H&L la sm h.
Hoe omgaan met SBL.

6-12-2013.

la sm h → komt uit Rijk.

- Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor
het n voeren van deze soort van logistiek.

→ helder maken wat aangeboden moet worden?
veel dat is niet helder stoppen met buke.

→ UVA heeft sommige partijen al ingelooft probleem?
Dat is lastig maar niet onmogelijk.

→ proces nodig e organisatorisch bij te houden
begreep ik van Rijk is dat nog zo? wat mis je?
UVA weet goed waar we uit moet komen is maar
aanvulling van het bestaande verkoopplan

→ Ik mis een stoppen plan hoe e uit de hand varen
worden de zijn voor SBL. → wat is uw ervaring?
Deze mening deed ik zie vorig punt.

→ Ik wil een soort stoppen plan e de vorm van een
skema maken — hoe je dan vervolgens het
concept project geven den toepast

→ wat moet we aanleveren van het project.

→ bestaande verkoopplan van project?

→ werk begroting (nog niet helemaal voorbereiding)

obligatie plan van

= mag ik een vervolgafspraak maken?

Bedrijfsbezoek Hark lesm.h.

Sjocco.

3/4

6-12-2013

Bevindingen van Hark lesm.h.

- ondernemers neemt contact op met anderen ondernemers
- 5% van ondernemers
- Uit vanden van het netwerk heeft veel met UTS.
- flexibiliteit op het vlak van (omzet)
- Noorden → tegels zonder verpakking
- open open toefel samenwerking om/wim
- Stokk maar niet sterk. (UTS)
- Schiedt of bijg afhangt.
- Voorward beter systeem. UTS dat is een sterk punt.
- Uit vanden overleg. elke week planning met UTS.
- Reelghe met anderen ondernemers voorward beter systeem.
- Zien lang geschiedenis → door heeft lang en g. met ma.
Soms mensen daardig uit vanden met
ende it over
- Wissel wende met BAT - UTS. Heel belang rijk.
- Wissel wende

Bedrijfsraad Hahn la smt.

4/4
6-12-2013

- nken bij BAM moeten we ook naar weten.
- we moeten hen gebieden.
- m² afbouw 25 pallet ca. bed.
- 10000 m². afbouw is bij voorbeeld 1000 pallets
- economis / rvo

maand → uitbreiden BAM uitbreiden
Stijge bijen. → PRON

onderleggen bouwplaats

Gesprek met Simon Tan
Voortgang / nieuwe begeleiding.

Giacco
Janner.

18-12-2013.

→ Alleen eerst bevestigen dat je me wilt helpen.

✓ planning.

✓ plan van aanpak zodat je weet wat ik doe.

— status tot nu toe.

→ in keuzes.

→ Enquetes. bouwplaats personeel. } veel vragen.

→ enquetes uit de rede werken

✓ offerte laten zien.

✓ werkplan ICP → Mark Lensink.

✓ pallet plaats berekening om te zien of er genoeg is bij offerte
— hoeveel trest slot per m². (ingetallen)

✓ kosten Baten

✓ om volledig werk plan in de vorm van schema (stroom)
wanneer en wat op welke tijdstip aan komen.

— Wij als Bam weten kosten van logistiek niet!!

✓ afspraak na vakantie met Begeleider?

— yoonson. regelen. met leen.

— der smit

UvA Amsterdam

Direktiegroep / Kennismaking

Sjacco

Jacques

14.01.2014

Aanwezig: Simon Ton

Dan Wouw

Lenard Broekman, Kivv

Sjacco Jacques

Dan Wouw / Leerling

- + Simon heb je je een beetje kunnen inleven?
- + Verloop met scriptie: nog niet echt een verhaal.
Moet ik in elk hoofdstuk een item inleidend ver-
haaltje schrijven?
- + Zodat anderen / leek het ook snapt.
- + Staat nu nog een beetje roerend door elkaar heen.
- + Hoofd en bijzaken schieden hoe te doen is daar en
varen voor?
- + Moet ik het bestaande plan (logistiek fase 1 + 2)
meer samen smelten?

⊖ planning nu week 3 — concept inleveren
week 8 — als ik in week 4/5 het stuk inleveren
Sjacco heb ik tot week 8 om dingen om te praten
dit moet toch haalbaar zijn? wat vinden jullie?

⊖ Conclusie mag toch ook zijn dat niet alles volledig
bekend is → grote projecten denk lastig weet dat ook
nog niet!

⊖ Literatuur / Bronnen onderzoek ook tussen voren?

1/3.

Afstudeer Stacco Jeyes.
procesbeoordeling

Stacco Jeyes.

17-02-2014

Afstudeerproject. Voortgang/indagapret.

aan werkg:

Leonard Bachelmon (Hm)

Jan. Peter van Doelen (Hm)

Simon Ton (Bm ubouw)

Stacco Jeyes. (Bm + student)

Student nummer.

Route geven voor het n planeten.

in ge de hantrekter.

1. dacht dat het al meer is.

3 tot 5 procent. op basis van een zoek pagina.

→ hoe vaden

Co-chair.

probeer bnd e ondergrens

evenius.

Luse (26 - 28)

~~Student nummer~~

voortzetting

Succes

17-02-2014

toepassen van Smart Building logistiek op de projecten
maar de invloed en toepasbaarheid binnen de organisatie
is niet duidelijk doordat het vrij nieuw is.

- + aanleiding: het wordt opgelegd door BAM maar weten niet hoe
- + probleem: de invloed en toepasbaarheid is niet bekend.
- + Doel: verbeteren van de logistiek

- + Systeem de handhaving is niet duidelijk en concreet zijn en geen echte aanwijzingen geven.

- wie moet wat doen in welke fase van de bouw — handhaving
- Is het rendabel — kosten-baten model
- moet de project op een wijze uitgeroerd worden volgens operationeel plan wel maar zonde te weten wat de invloed is → van de stroomlijnen

Door de handhaving wordt het vergemakkelijkt wat wie moet doen. + schema wie doet wat.

Door kosten-baten terug rendabiliteit weet je waar de kosten liggen

Stroomlijnen kan ik ook zien gekomen dat het altijd wel zijn heeft maar het is niet gelukt van daar naar het resultaat.

Conclusie: Logistiek kost geld maar kan ook kosten opleveren dat het minder is dan gedacht is

2/3

voortgang gespet

Secco

17-02-2014

Verslag "Afbakening"

verschil met legitiem plan en Nieuwe methode
stakeholders (steeds anders)
Conclusie verschillen megeven.

leen namen met UT's megeven

door het ontwikkelde politiek plaatskennings ha. uit andere
en overneming zijn legitiem hok juist op de m.

Handleiding geoptimaliseerd. en eigen producten en
megeven

Met uit werking verwacht door hante/bate

o Hoofdstukken xhane van.

Toestemmingsformulier Afstudeeropdracht

Betreft opname van de digitale versie t.b.v. de HBO-Kennisbank

Naam student	Sjacco Jognes
Studentnummer	472532
Titel Afstudeeropdracht	Nieuwe logistieke aanpak projecten
Opleiding	Bouw Management Uitvoering
Naam Assessor	Sina Ton. (Ban) / Leonard Broekman (HAN)
Instelling/Bedrijf:	Ban Utiliteitsbouw Amsterdam
Adres:	Elsrijdsdijk 207
Vertegenwoordigd door:	Sina Ton


Bovenstaanden geven hierbij WEL / GEEN toestemming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om de bovengenoemde afstudeeropdracht digitaal op te nemen in de repository (databank) van de HAN, waardoor de afstudeeropdracht gratis, volledig full text en online geraadpleegd kan worden via www.hbo-kennisbank.nl

Het auteursrecht op de afstudeeropdracht blijft rusten bij de student

De student levert dit formulier in bij zijn/haar opleiding tegelijk met een digitale versie van zijn/haar afstudeeropdracht die aan de volgende eisen voldoet:

- De afstudeeropdracht is 1 .pdf bestand. Enige uitzondering zijn bijlagen.
- De volgende zaken staan duidelijk vermeld:
 - De naam en het studentnummer van de studenten
 - De opleiding waar de student is afgestudeerd en de datum van afstuderen
 - De titel van de afstudeeropdracht
 - 3 trefwoorden die de afstudeeropdracht karakteriseren

Aldus verklaard op/te:

Handtekening Instelling/Bedrijf:			
Datum:	4-3-2014	Plaats:	Amsterdam
Handtekening Student:			
Datum:	03-03-2014	Plaats:	Amsterdam

In te vullen door de assessor:

Datum	Naam	Paraaf	Cijfer
4-3-'14	S.H. Ton		

Wilt u meer weten over de HBO Kennisbank: www.hbo-kennisbank.nl

Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij het Studiecentrum van de HAN.
Contactpersoon: maarten.hekman@han.nl

19 oktober 2009

De laatste loodjes

Van: Lenard Brokelman <lenard@brokelman.nl>
Aan: Sjacco <s.jaques@upcmail.nl>
CC: "Ton, Simon" <SH.Ton@bamutiliteitsbouw.nl>

Prioriteit: Normaal
Datum: 27-02-2014 07:38

Beste Sjacco,

Nu jij de laatste puntjes op de i aan het zetten bent is het ook belangrijk om alle formaliteiten rond het afstuderen correct uit te voeren. Deze handleiding helpt jouw daarbij.

Stap 1: Relevante data

Allereerst de data waarop het een en ander dient te gebeuren.

Inleveren scriptie	Verdedigen scriptie	Diploma uitreiking
Uiterlijk 11 maart 2014	25 28 maart 2014	3 juli 2014

Stap 2: Inleveren van het formulier Tussentijdse beoordeling

Vervolgens is het van belang dat het formulier met de tussentijdse beoordeling - ook wel *tussentijdse peiling* genoemd – ruim voor het inleveren van de scriptie is ingeleverd bij Ernest Boel. Dat heb ik inmiddels gedaan.

Stap 3: Controle op plagiaat

Je werkstuk moet door Ephorus worden gehaald. Het gaat hier om een standaard controle die antwoord moet geven op de vraag of de student plagiaat pleegt. Alleen het werkstuk moet door Ephorus worden gehaald en niet de bijlagen!

De werkwijze voor de student is als volgt:

- Akkoord van begeleiders om procedure te starten.
- Inlevercode voor BMU-studenten is: info@ernestboel.nl
- Student gaat naar <http://student.ephorus.nl>
- Student vult gegevens in en 'verstuurt' de opdracht.
- Ernest Boel krijgt automatisch een bericht vanuit Ephorus en kan de student direct per mail uitsluitel geven.

Voorbeeld van de Ephorusverklaring

Van: services@ephorus.com [mailto:services@ephorus.com]

Verzonden: vrijdag 3 januari 2014 17:09

Aan: info@ernestboel.nl

Onderwerp: Ephorus: Document ingeleverd door: N.N.

Beste E.Boel,
Een van uw studenten heeft een document ingeleverd.
Naam: N.N.
Studentnummer: 123456
E-mail: N.N.@etcetera
Document: info@ernestboel.nl – N.N. - 123456
Notificatie instellingen (wijzig instellingen)
U ontvangt een e-mail als een student werk inlevert.
U ontvangt een e-mail als Ephorus tenminste 0% mogelijk plagiaat heeft geconstateerd.
U ontvangt geen periodiek overzicht van alle nieuwe documenten.
Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. Mocht u vragen hebben stuur dan een bericht naar support@ephorus.com.
Wilt u meer weten over de HBO Kennisbank: www.hbo-kennisbank.nl Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij het Studiecentrum van de HAN. Contactpersoon: maarten.hekman@han.nl

Stap 4: Inleveren scriptie (uiterlijk 11 maart a.s. !)

Afdrukken van scriptie in 3 voud voor het inleveren + 3 maal op een dvd inclusief de procesmap met urenverantwoording, besprekingsverslagen en alle andere zaken die aantonen wat jullie allemaal hebben gedaan tijdens het afstudeerproces

Stap 5: Kennisbank

Formulier invullen (zie bijlage) waarmee je verklaart of jouw scriptie wel of niet in de HBO kennisbank mag worden opgenomen. Ook invullen als je dus geen toestemming geeft! Zie aangehechte bijlage.

Stap 6: Voorbereiden van de presentatie en verdediging van de inhoud van de scriptie**Stap 7: Presentatie en verdediging volgens de planning**

Hartelijke groet.

Lenard Brokelman.

130829 HBO-Kennisbank Toestemmingsformulier-Nederlands.pdf	Inhoud: application/pdf; name="130829 HBO-Kennisbank Toestemmingsformulier-Nederlands.pdf" Grootte: 82,73 KB
---	---

Jaques, Sjacco

Van: Ernest Boel <info@ernestboel.nl>
Verzonden: donderdag 27 februari 2014 9:07
Aan: Jaques, Sjacco; 'René Kokke'; Roelof van Steenis
CC: Ron Bosch; Lenard Brokelman
Onderwerp: laatste loodjes BMU

Beste Sjacco, René en Roelof,

Nu jij de laatste puntjes op de i aan het zetten bent is het ook belangrijk om alle formaliteiten rond het afstuderen de revue te laten passeren.

Eerste is eigenlijk het formulier met de tussentijdse beoordeling. Die is inmiddels al ingestuurd en verwerkt.

Daarna de volgende stappen:

1. Je werkstuk moet door Ephorus gehaald worden (standaard controle op plagiaat voor alle studenten) Let op; alleen het werkstuk dus niet de bijlagen!

Stappenplan voor student:

Na akkoord van begeleiders

Inlevercode is HAN-e-mailadres van de docent. Voor BMU-studenten info@ernestboel.nl

Student gaat naar <http://student.ephorus.nl>

Student vult gegevens in en 'verstuur' de opdracht.

Ik krijg automatisch een bericht vanuit ephorus en kan direct uitsluitel geven.

2. Afdrukken van scriptie in 3 voud voor het inleveren + 1 maal op een dvd ² → 3x
inclusief de procesmap met urenverantwoording, besprekingsverslagen en alle andere zaken die aantonen wat jullie allemaal hebben gedaan tijdens het afstudeerproces

3. Vrijgave formulier voor opname in HBO kennisbank invullen (ook als je dus geen toestemming geeft)

4. Voorbereiden van de presentatie

5. Presentatie volgens de planning

Inleveren van de hardcopy's met de dvd uiterlijk 11-03-2014 bij het onderwijsbureau, 1^e verdieping F-gebouw, achter de balie (bij Bianca Weichert, Nicole van Elst, Lydy Augustijn)

Succes met deze laatste stappen!

Groet,

Ernest Boel

Opleidingscoördinator BMU

Academie voor Bouw en Infra

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

076-5932853

06-51223220

info@ernestboel.nl

9.12.2: Proces aanpak onderzoek



9.12.3: Aktielijst



Naam: Sjacco Jaques Klas: BMU 12.2 Studentnummer: 471531 Onderdeel: Afstuderen		Instelling/ school: Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN) Bedrijf/ opdrachtgever: Bam Utiliteitsbouw Onderwerp: Urenverantwoording Datum: maart 2014		Hogeschool van Arnhem en Nijmegen BAM UTILITEITSBOUW	
Item	Omschrijving	Naam	Datum gereed	Status	Opmerkingen
1	Inleiding			Gereed	800 uur verdelen over 8 maanden? Eerste aanzet gemaakt 12-05-2013
2	Schied van de gemeente		lopende akte		Inpassen in planning
3	Adressen		lopende akte	Niet gereed	Blijvende akte tot einde wel belangrijk
4	Urenverhaal			Niet gereed	
5	Urenverhaal			Niet gereed	
6	Urenverhaal / scriptie			Niet gereed	Overleg met Lenard
7	Scriptie			Niet gereed	Overleg met Lenard
8	Scriptie			Niet gereed	Overleg met Lenard
9	Analyse		24-9-2013	Gereed	Zie groene map
10	Analyse			Gereed	Marc stuurt wat presentaties op
11	Analyse			Gereed	
12	Analyse			Gereed	Tenueverdienmodel, een soort standaard voor een project maken
13	Analyse			Niet gereed	Maakt nog het 'uitgevoerd' van de modellen op sytlijnen
14	Analyse / onderzoek			Niet gereed	
15	Scriptie			Gereed	f.rankouderes@hotmail.com
16	Analyse			Niet gereed	
17	Scriptie			Niet gereed	
18	Analyse / onderzoek			Gereed	
19	Scriptie / onderzoek			Gereed	Case studie gebruik ook modelletjes / tevens aanvullen voor scriptie weer een pagina
20	Scriptie / onderzoek			Gereed	
21	Scriptie			Niet gereed	Er is een planning met Lenard
22	Scriptie			Gereed	
23	Scriptie			Niet gereed	Belangrijk met Lenard samenwerken!!!
24	Analyse / onderzoek			Gereed	
25				Gereed	12-10-2013
26					Met Ernst afgesproken dat de gesprekken die ik heb gehad de aantekeningen inscannen en gebruiken voor in urenverantwoording niet te moeilijk over doen. >>> besproken met Lesday 11-10-2013!
27					Bedenken wat je wil >>> andere begeleider zoeken?!
28					
Legenda					
					Gereed akte klaar
					Niet gereed Akte groen maken wanneer gereed
					Akte voor een ander
					Blijvende akte zie periode in opmerking / of aanhouden



